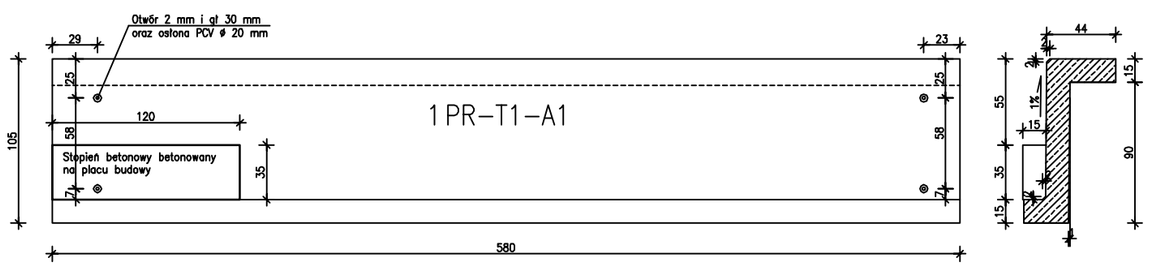

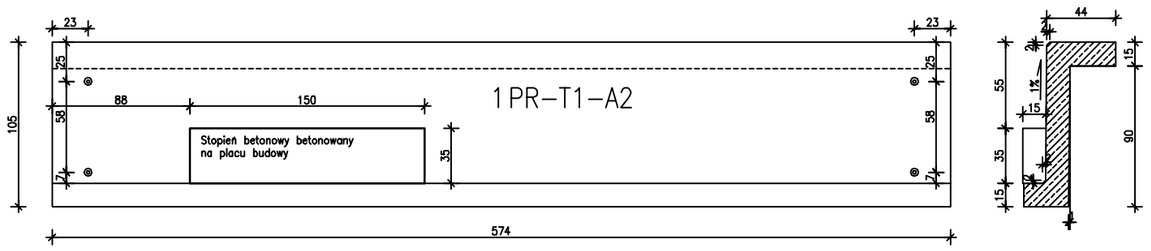







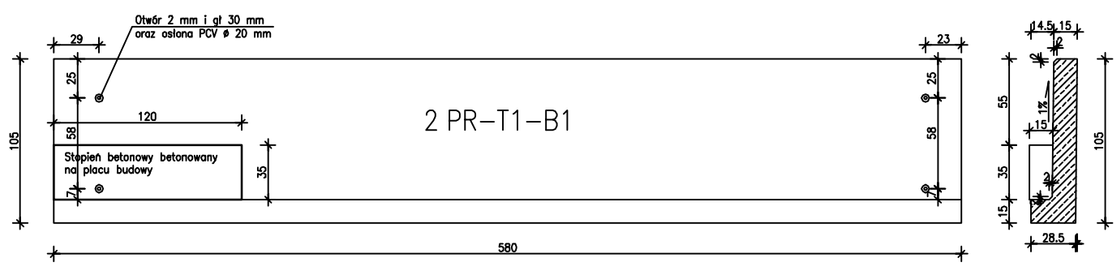

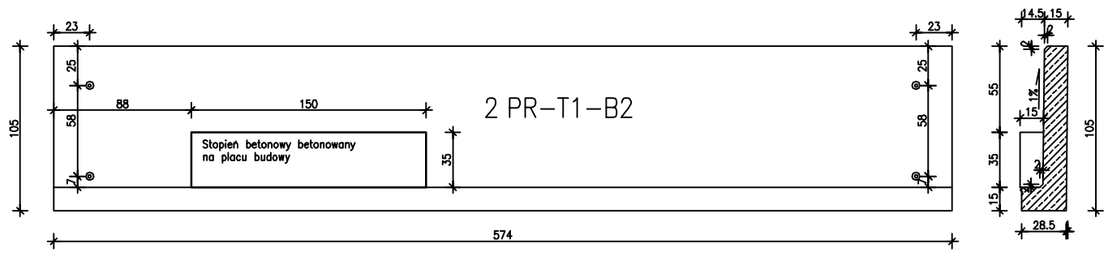

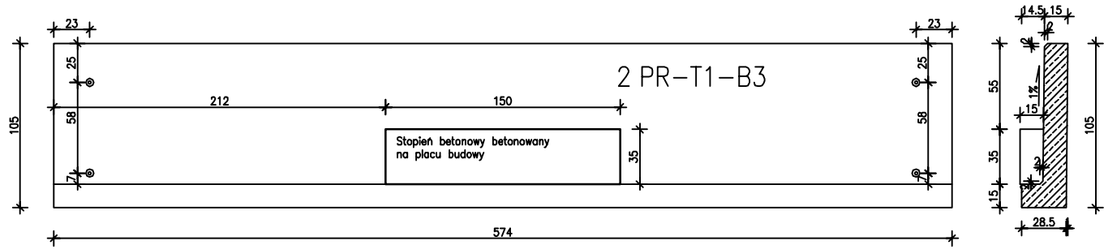

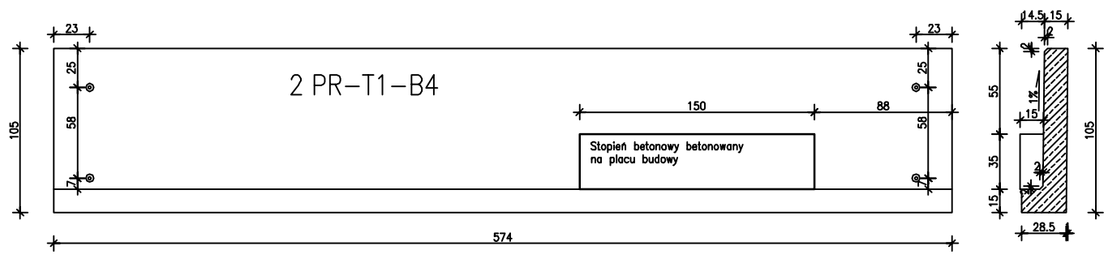

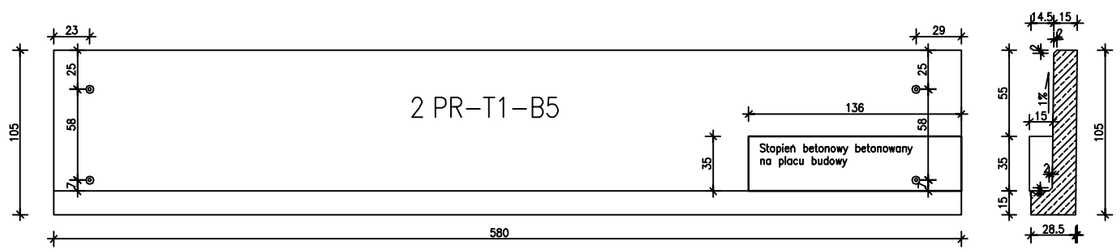

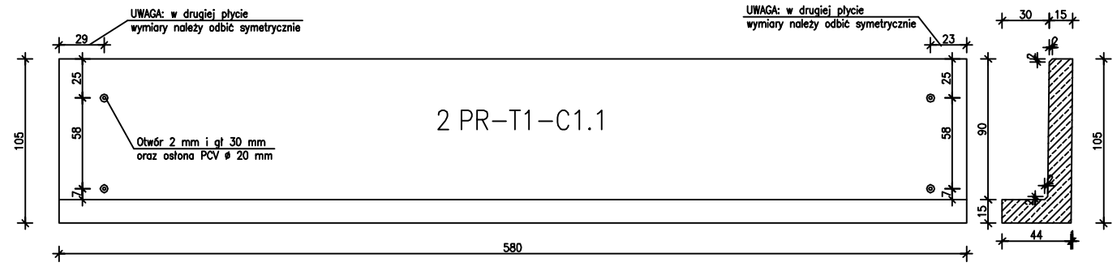

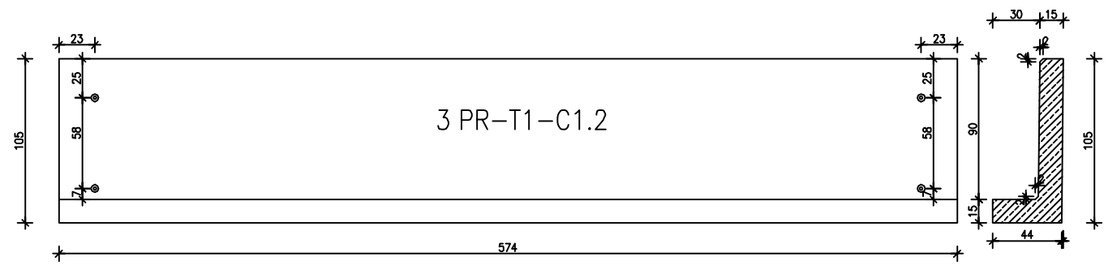

ZESTAWIENIE PREFABRYKATÓW
Trybuna

LP	Symbol prefabrykatu	Liczba sztuk
1	PR–T1–A1	1
2	PR–T1–A2	1
3	PR–T1–A3	1
4	PR–T1–A4	1
5	PR–T1–A5	1
6	PR–T1–B1	2
7	PR–T1–B2	2
8	PR–T1–B3	2
9	PR–T1–B4	2
10	PR–T1–B5	2
11	PR–T1–C1.1	2
12	PR–T1–C1.2	3

DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA KONSTRUKCJI PREFABRYKOWANEJ:
– zgodnie z PN–82/B–02355 oraz PN–62/B–02356

UWAGA: Na etpoie prefabrykacji elementów żelbetowych trybun należy dokonać weryfikacji przyjętych rozwiązań technicznych w stosunku do technologii prefabrykacji stosowanej przez dany zakład prefabrykacji.
Przed przystąpieniem do wykonania prefabrykacji elementów, należy uzyskać akceptację przyjętych rozwiązań technicznych przez inspektora Nadzoru Inwest. oraz Projektanta branży konstrukcyjnej.

Stopnie żelbetowe wykonywane na płytach prefabrykowanych należy zabetonować na placu budowy po zamontowaniu płyt.

Beton min. C25/30 (B30)
Stal A–IIIN (RB500W)
A–I (St3S)
dg = 16 mm
Otulina min. 25 mm

– nasiąkliwość nie większa niż 5%;
– stopień mrozoodporności F = 150 (wg PN–88/B–06250);

Obciążenie płyt trybun

Płyty trybun obciążone obc. zmiennym równomiernie rozłożonym o wartości p_k=4,0 kN/m2 ponad ciężar płyty.
Wsp. γ_f = 1,30



UWAGA: Zbrojenie płyt należy dobrać na etapie prefabrykacji.

Dobór zbrojenia płyt prefabrykowanych trybun należy powierzyć osobie posiadającej wymagane uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno – budowlanej.

INWESTOR:	Miasto i Gmina Łasin ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin
PRZEDMIOT:	Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy i modernizacji Stadionu Miejskiego w Łasinie
MIEJSCE JEDN.:	ul. Tysiąclecia, dz. nr 627, obr. 0021 , jedn. ew. 040603_4 Łasin miasto
	Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana "PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński 86-302 Waldowo Szlachockie 67 G tel. kom. 607 620 777 e-mail: psbud@interaj.pl
NAZWA RYSUNKU:	Prefabrykaty żelbetowe trybuny
SKALA:	1:20
STADIUM:	Budowlana
UWAGI:	Projekt budowlano - wykonawczy
DATA:	19.11.2016r.
NR RYSUNKU:	KT - P1

UWAGA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Radosław Łukowski	IS-NPOK-0/2333	ARCHITEKTONICZNA	
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Świrzyński	IA/P-0/2.30 /PM/2439	KONSTRUKCJA	
